



סטטוס פרויקט LIGHT HOUSE **אוקטובר 2018**

קצב הבנייה ממשיך להתקדם ולעלות לגובה !
אנו שמחים לדווח על התקדמות העבודה במגדל לייטהאוס .

התקדמות העבודות:

- במהלך החודשים אחרונים , הושלמו עבודות בניה במרתפים.
- שלד המגדל יצוק עד רצפה של קומה 22 כולל וקירות גרעין עד קומה 23.
- חזיתות המגדל : בביצוע זיגוג חמש קומות ראשונות ומתקדמים במקביל בכל החזיתות.
- ביצוע מערכות אינסטלציה, חשמל, אוורור ומיזוג בביצוע בקומה ראשונה.

צפי לחודשים הקרובים :

- שלד : יציקת קומה 30 במהלך חודש ינואר 2019.
- חזיתות : במהלך חודש ינואר צפוי להסתיים זיגוג חזיתות עד קומה 9.
- מערכות וגמרים : במהלך חודש ינואר 2019 צפוי להסתיים ביצוע מערכות אינסטלציה, חשמל, אוורור ומיזוג כולל ריצוף ותקרת גבס בקומה ראשונה, והמשך עבודה בקומות הבאות.

מצ"ב תמונות להתרשמות

בניה במרתף ובחניונים (2-):




הכנות ליציקת רצפה קומה 21 לכיוון מערב :



המגדל מכיוון צפון מזרח



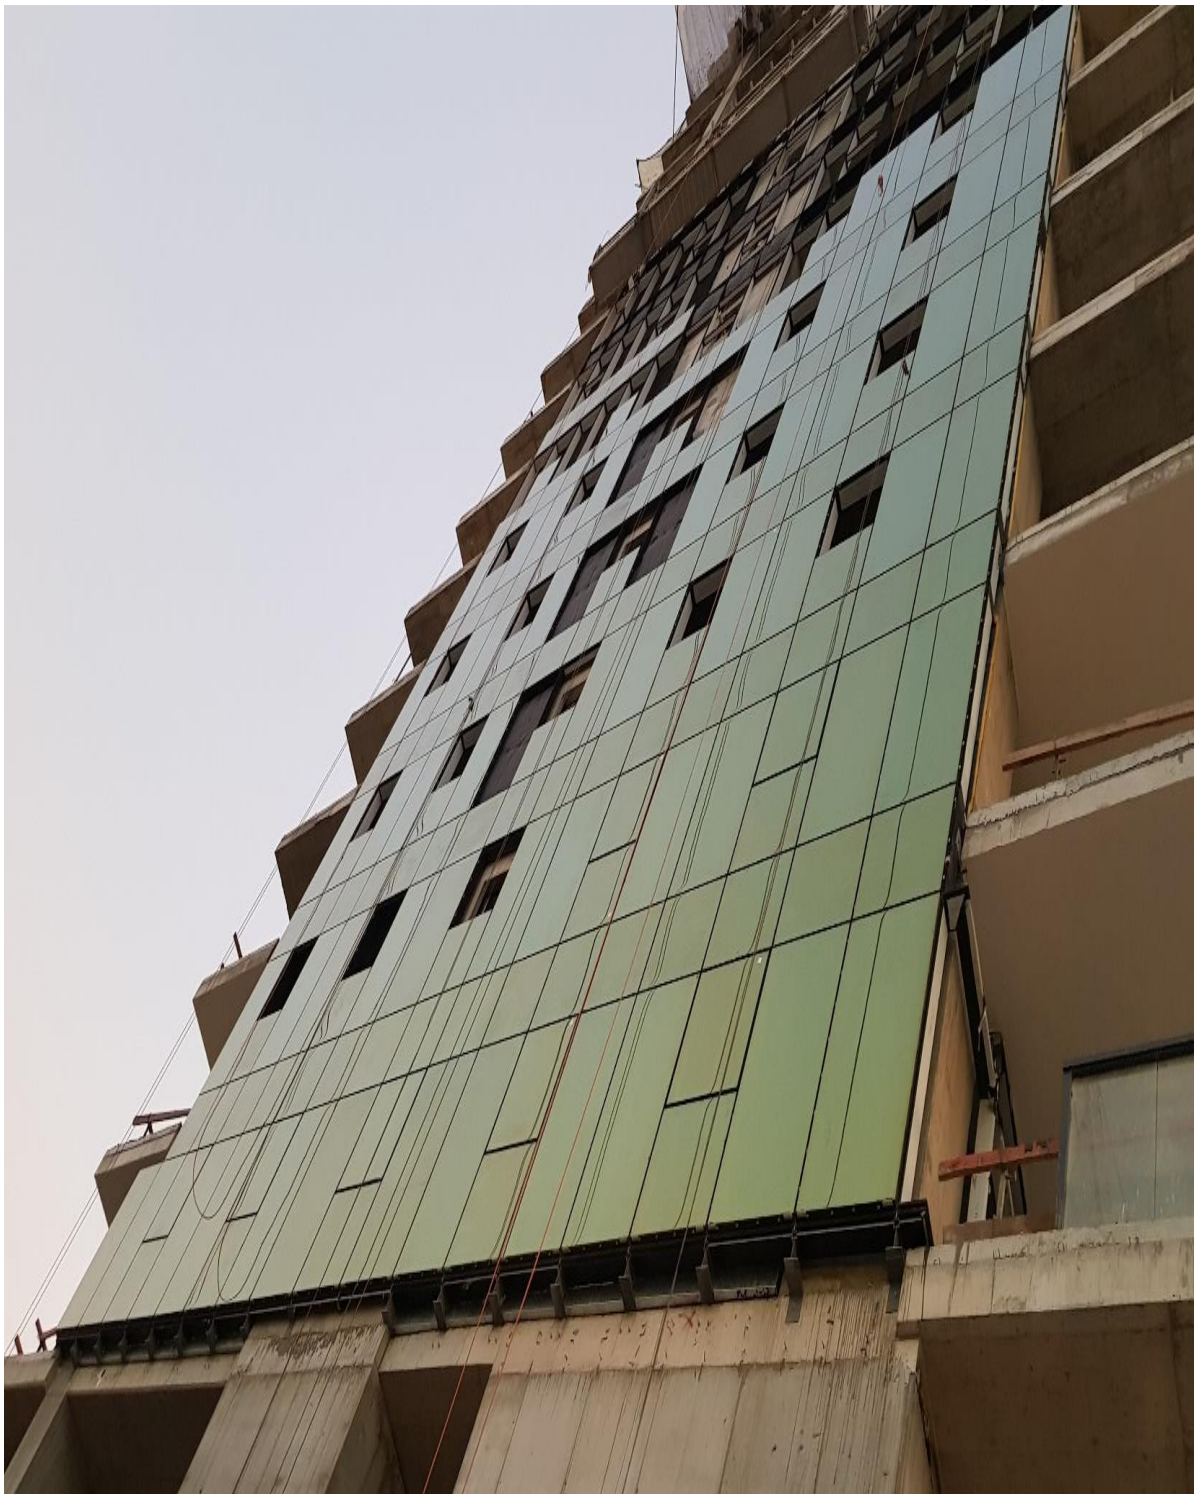

מערכות וגמרים בביצוע בקומה ראשונה.



תמונה של המגדל לכיוון צפון

